

BILL OF MATERIAL

MARK	TOTAL QTY	SHAPE	LENGTH	TOTAL WEIGHT	REMARKS	ADV MILL #	STEEL GRADE
1B5	1	HSS8X6X3/8	11'-2 5/8"	343	BEV-2 GALV		A500-GR.B
p53	2	PL3/8"X3"	0'-3 1/2"	2			A36
p168	2	PL1/4"X1"	0'-4 1/2"	1			A36
p169	2	PL1/4"X1"	0'-6 1/2"	1			A36
p171	1	PL1/4"X5 5/8"	0'-7 5/8"	3			A36

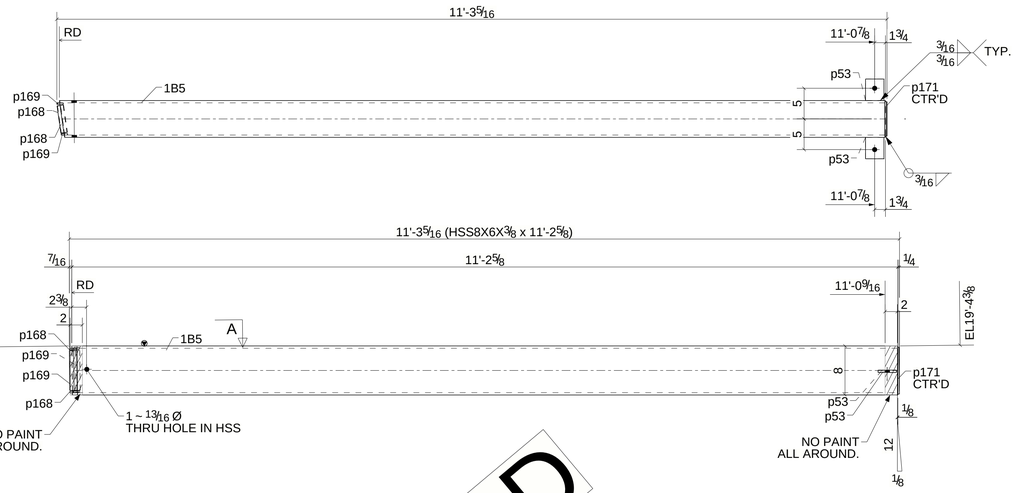



A - A

HOLD

ONE - BEAM - 1B5

GRID LOCATION	BOTTOM ELEVATION
5-4/U.5-W	18'-8"3/8

REV.	DATE	DESCRIPTION
0	04/11/2025	For Fabrication
B	03/24/2025	For Re_Approval
A	10/16/2024	For Approval

Building Envelope Systems
20 HIGH STREET
PLAINSVILLE, MA 02762
PHONE (508) 381-0429
www.teambes.com

MATERIAL: A36 UNO
HOLES: 13/16Ø UNO
WELDS: E70XX
SURFACE PREP.: SSPC SP2
PAINT NOTE : SW SHOP PRIMER

PROJECT NAME: GSC JUNIPER RBP PHASE-II
LOCATION: PARKWAY EVERETT, MA
CONTRACTOR: BUILDING ENVELOPE SYSTEMS
DWG TITLE: BEAM

DRAWN BY	CHECKED BY	DATE DRAWN	PLOT DATE	DGSTS No.
ABJ	HSR	03/24/2025	03/24/2025	--

CONTRACT No. 24050 | DWG No. 1B5 | REV. 0

Tekla Structures

SHOP NOTE:
